


Avstämning fiberprojekt BRAVO 2016-11-09

Stamfibernet som är klart till i dag 2016-11-09

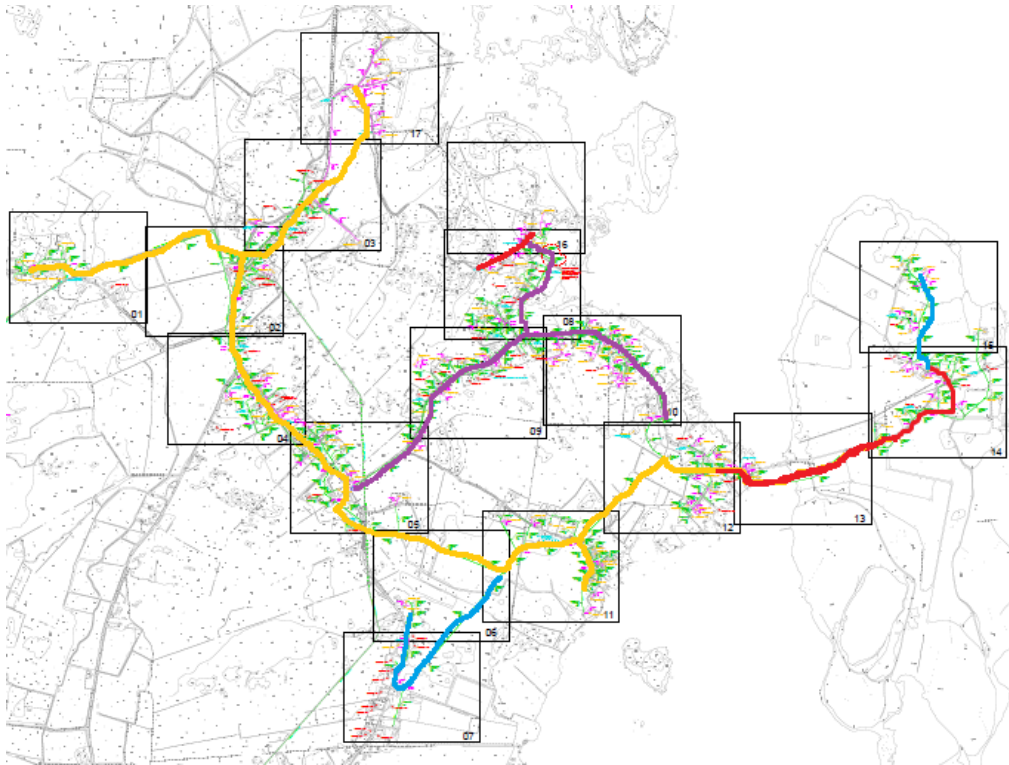

Orange + röd = subkanalisation klar i stamnätet och/eller grävt nytt.

Orange är sträckning där stamfibrerablarna är blåsta.

Blå sträckning är vad som beräknas vara subkanaliserat/grävt nästa vecka (46)

Lila beräknas vi subkanalisera vecka 47 och 48.

Fiberblåsning av både servis-kabel och resterande stamkablarna räknar vi med att blåsa under löpande under vecka 46-48.

Fibersvetsare är planerade att svetsa upp noden och fortsätta ut på sträckan med skåpen under nästa vecka (46).

Installationer av villor ska vi börja på med under vecka 46/47 främst i Kättilsäng och Oxlabby, för att sedan följa kablarna från noden söder ut.
